

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 7.2 ZŠ Karloveská 61 – multifunkčné ihrisko	
Názov predmetu investície	Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61	
Opis predmetu investície	Zámerom bolo vybudovať viacúčelové ihrisko na existujúcej spevnenej ploche rozmeru 25x13 (m). Práce realizované v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> - Úprava povrchu multifunkčného ihriska - Odvodnenie multifunkčného ihriska - Dodávka a montáž mantinelov so záchytnými sieťami - Dodávka a montáž športového vybavenia 	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	77.000 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	64.517,71 eur s DPH	
Fakturovaný náklad	64.130,77 eur s DPH	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	áno
	b/ v realizácii	-
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	-
	d/ nezačaté	-

Pôvodný stav



Nový stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022


spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	
Názov predmetu investície	Spojovací chodník Mokrohájska - OC Galéria Lamač	
Opis predmetu investície	Zámerom je vybudovať nový spevnený chodník, ktorý bude čiastočne riešiť pešiu komunikáciu od bytovky na Mokrohájskej ceste s napojením na chodníky ku OC Galéria Lamač.	
Typ obstarávania	Zatiaľ nebolo obstarávanie na zhotoviteľa. Príprava je v procese povoľovania stavby stavebným úradom (územné konanie)	
Odhadovaný náklad	45.000 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	---	
Fakturovaný náklad	---	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	Vydané právoplatné územné rozhodnutie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Podat' žiadosť o stavebné povolenie
	d/ nezačaté	viď poznámka

Poznámka:

V rámci inžinierskej činnosti bola vybavená dokladová časť k podaniu žiadosti o Stavebné povolenie. Vzťah k pozemku KNE parc. č. 19764 (Rímskokatolícka cirkev) je v procese riešenia.

Súčasný stav

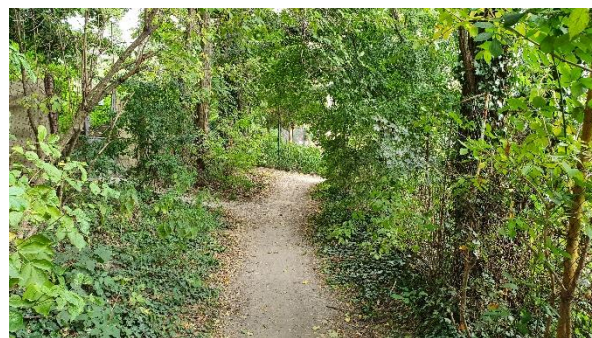

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ulici – z MFSR	
Názov predmetu investície	Chodník pozdĺž Perneckej ulice v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves	
Opis predmetu investície	Zámerom je vybudovať nový chodník pozdĺž existujúcej cestnej komunikácie na Perneckej ulici. Chodník bude šírky 2m zo zámkovej dlažby. Zároveň bude zrealizovaná prekládka verejného osvetlenia a náhradná výsadba.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	234.128,95 eur s DPH podľa rozpočtu z projektovej dokumentácie	
Vysúťažený náklad	181.497,14 eur s DPH	
Fakturovaný náklad	Zatiaľ nefakturované	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	áno
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Ukončenie stavebných prác, kolaudácia stavby
	d/ nezačaté	-

Pôvodný stav



Nový stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 6.2 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (memorandum 11H)	
Názov predmetu investície	Vybudovanie nadstavby parkoviska – novostavba Ľ. Fullu v Bratislave	
Opis predmetu investície	Zámerom je vybudovať novostavbu nad existujúcim parkoviskom, ktorá bude riešiť parkovanie osobných vozidiel v dvoch úrovniach. Po výstavbe bude v lokalite zabezpečené parkovanie pre 71 vozidiel	
Typ obstarávania	Zatiaľ nebolo obstarávanie na zhotoviteľa. Príprava je v procese povoľovania stavby stavebným úradom (stavebné konanie)	
Odhadovaný náklad	1.069.732,58 eur s DPH podľa rozpočtu z DSP/DRS	
Vysúťažený náklad		
Fakturovaný náklad		
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	Vydané právoplatné územné rozhodnutie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Podat' žiadosť o stavebné povolenie
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Podaná žiadosť o odstránenie stavby (existujúcej betónovej plochy) na stavebnom úrade.

Súčasný stav



Vizualizácia navrhovaného riešenia



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií


Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 7.1 MŠ Kolískova, prestavba ubytovne na triedu	
Názov predmetu investície	Navýšenie kapacity v MŠ Kolískova 14, prestavba ubytovne na triedu MŠ	
Opis predmetu investície	Zámerom je vybudovať novú triedu pre 23-25 detí prestavbou ubytovne. Disponibilné priestory sa nachádzajú v komplexe budovy škôlky, a nová trieda bude funkčne napojená na ostatné triedy a vybavenosť MŠ Kolískova.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	140.812,90 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	116.952,14 eur s DPH	
Fakturovaný náklad	-	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	áno
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Ukončenie stavebných prác
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav

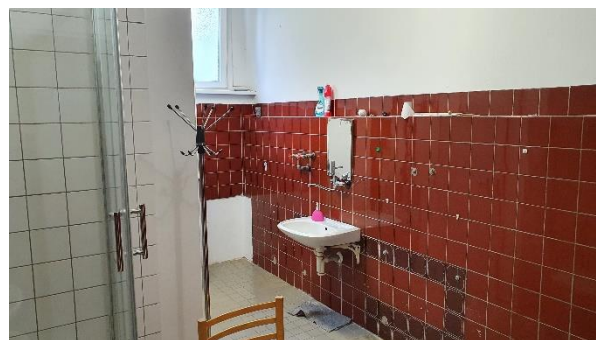

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 1 – Samospráva a strategické plánovanie 1.4.1 Strategické plánovanie-projekty MČ	
Názov predmetu investície	Obnova časti športového areálu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62	
Opis predmetu investície	Zámerom je rekonštrukcia a výmena povrchu bežeckého oválu (náhrada súčasnej antuky za nové EPDM), rekonštrukcia dráhy a doskočiska pre skok do diaľky.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	391.733,74 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	276.556,20 eur s DPH	
Fakturovaný náklad	-	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	áno
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Plánované ukončenie stavebných prác: október 2022
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav



Informatívny materiál

o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 2.7 – Projekty MČ Podprogramy - združené financovanie: <ul style="list-style-type: none"> - Projekt MITADAPT (program SK-Klima, Nórske granty) - Projekt DELIVER (program LIFE, EÚ) - Ostatné projekty (spolufinancovanie MČ) 	
Názov predmetu investície	Híbková obnova materskej školy Kolískova 14, Bratislava–Karlova Ves	
Opis predmetu investície	Híbková zelená obnova objektu s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Práce na obnove pozostávali z nasledovných opatrení: Zateplenie strechy a obvodového plášťa vrátane inštalácie hniezdnych búdok pre vtáctvo a netopiere, inštalácia tieniacich prvkov na fasáde, výmena okien, dverí a vstupných a zasklených stien, vnútorné silnoprúdové rozvody, inštalácia úsporných LED svietidiel, inštalácia rozvodov na využitie zrážkovej vody a retenčnej nádrže na zber vody, zdravotníctvo, vzduchotechnika – rekuperácia vzduchu nasávanie vzduchu z obnovených átrií s vysadenou novou zeleňou rôznej hydro-akumulačnej schopnosti s dôrazom na podporu biodiverzity, vybudovanie vodného prvku (2 jazierka), vybudovanie 3 zelených stien na fasáde a 15 vertikálnych lankových systémov s popínavými rastlinami, inštalácia solárnych panelov, rekonštrukcia terasy, rekonštrukcia časti umyvární/WC v 2.bloku, ktoré neboli zrekonštruované v predošlej rekonštrukcii. Vyregulovaný systém je optimalizovaný z hľadiska prietokov vo všetkých vetvách a vyznačuje sa hydraulickou stabilitou. Dodávaný tepelný výkon siete je rovnomerný, čím sa odstráni poruchy prekurovania jedných a nedokurovania iných častí objektu, čím sa zvýši účinnosť systému. Termostatizácia umožní individuálne nastavenie a zároveň automatické udržiavanie požadovanej priestorovej teploty vo všetkých vykurovaných miestnostiach, ako aj uzatváranie vykurovacích telies v prípade externých tepelných ziskov tepla.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie - EVO	
Odhadovaný náklad	1 068 530,70 s DPH (Rámcová dohoda + dodatky navyše práce a práce nad rámec projektov MITADAPT a DELIVER)	
Vysúťažený náklad	964 375 s DPH	
Reálny fakturovaný náklad	Zatiaľ boli zrealizované úhrady vo výške 910 704,12 EUR (bez zádržného a zábezpeky), v júni 2022 budú zrealizované úhrady zábezpeky (15%, 114 033,54 EUR) a úhrada zádržného (5%, 43 793,01 EUR) bude zrealizovaná až v roku 2023.	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	áno
	b/ v realizácii	-
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	-
	d/ nezačaté	-

Informatívny materiál

o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov

<p>Položka v rozpočte</p>	<p>Kapitálové výdavky Program 2.7 – Projekty MČ Podprogramy - združené financovanie: - Projekt MITADAPT (program SK-Klima, Nórske granty) - Projekt DELIVER (program LIFE, EÚ) - Ostatné projekty (spolufinancovanie MČ)</p>	
<p>Názov predmetu investície</p>	<p>Híbková obnova ZŠ A. Dubčeka, Bratislava –Karlova Ves</p>	
<p>Opis predmetu investície</p>	<p>Híbková zelená obnova objektu s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Práce na obnove zhrňajú napríklad: Zateplenie strechy a obvodového plášťa vrátane inštalácie hniezdných búdok pre vtáctvo a netopiere, inštalácia tieniacich prvkov na fasáde, výmena okien (tie čo neboli menené za predošlej rekonštrukcie) , vnútorné silnoprúdové rozvody, inštalácia rozvodov na využitie zrážkovej vody a retenčnej nádrže na zber vody (meranie a regulácia je v rámci zdravotníckej riešenej automaticky na jednotlivých komponentoch. V zdravotníckej na riešenom objekte sa bude merať spotreba zrážkovej vody v retenčnej nádoby RN1 za pomoci automatickej riadiacej jednotky a taktiež sa bude za pomoci prietokomeru merať spotreba pitnej vody pre dopĺňanie nádrže RN1), vzduchotechnika – rekuperácia vzduchu nasávanie vzduchu z obnovených átrií, kde bude vysadená nová zeleň rôznej hydro-akumulačnej schopnosti s dôrazom na podporu biodiverzity, vybudovanie vodného prvku, vybudovanie zelenej steny na fasáde a menšej zelenej strechy nad vchodom do budovy, inštalácia OZE - solárne panely a fotovoltické zariadenie. Vybudovanie novoprotjektovanej miestnosti na Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu (z časti výmenníkovej stanice), samostatný vchod z ulice Ľ.Fullu.</p>	
<p>Typ obstarávania</p>	<p>Verejné obstarávanie - EVO</p>	
<p>Odhadovaný náklad</p>	<p>2 129 193,38 EUR s DPH (podľa projektovej dokumentácie, avšak predpoklad je nárast nákladov vzhľadom na rast cien stavebných materiálov)</p>	
<p>Vysúťažený náklad</p>	<p>2 066 125,15 EUR s DPH (Rámcová dohoda, avšak predpoklad je nárast nákladov vzhľadom na rast cien stavebných materiálov a možné navyše práce)</p>	
<p>Reálny fakturovaný náklad</p>	<p>Zatiaľ 0 EUR</p>	
<p>Stav investície v rozdelení:</p>	<p>a/ ukončené</p>	<p>áno/nie plán: 30.04.2023</p>
	<p>b/ v realizácii</p>	<p>áno/nie</p>
	<p>c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva</p>	<p>žiadne</p>
	<p>d/ nezačaté</p>	<p>áno/nie</p>

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Monika Ďuricová, referát správy budov

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 1 - Samospráva a strategické plánovanie	
Názov predmetu investície	Rekonštrukcia elektroinštalácie SŠ Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves 3.časť, (podľa PD ako 2. a 3. etapa)	
Opis predmetu investície	Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie podľa vyhotovenej PD – 1.PP – chodby, 9x triedy, 2x soc. zariadenia .	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	72 735 EUR bez DPH (PHZ)	
Vysúťažený náklad	49705,52 EUR s DPH ZoD	
Reálny fakturovaný náklad		
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	áno/nie
	b/ v realizácii	áno/nie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	žiadne
	d/ nezačaté	áno/nie-termín zahájenia prác 4.7.2022

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 1 - Samospráva a strategické plánovanie	
Názov predmetu investície	Rekonštrukcia elektroinštalácie SŠ Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves 2.časť, (4., 5. etapa)	
Opis predmetu investície	Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie podľa vyhotovenej PD – 1.PP – kuchyňa, jedáleň, sklady, kancelária, príprava jedla, školník, dielne, chodba .	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	50 300 EUR bez DPH (PHZ)	
Vysúfažený náklad	50 886,51 EUR s DPH ZoD Dodatok č. 1 7 621,33 EUR s DPH – naviac práce havarijný stav rozvádzača Dodatok č. 2 6 941,62 EUR s DPH naviac práce	
Reálny fakturovaný náklad	65 449,46 EUR s DPH	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	áno 20.8.2020
	b/ v realizácii	-
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Realizácia ďalších etáp
	d/ nezačaté	áno

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 2.7 – Projekty MČ Podprogram: OP KŽP (EÚ EŠIF)	
Názov predmetu investície	Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia na ulici Veternicova	
Opis predmetu investície	Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na prístavbe miestneho úradu a vybudovanie vodozadržných opatrení na ulici Veternicova (tri vsakovacie záhony, zelený múr).	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	54 710 EUR s DPH (projektové dokumentácie, strecha: 43 836,14 Veternicova: 10 874,17)	
Vysúfažený náklad	38 970 EUR s DPH (strecha: 30 810 EUR, Veternicova 8 160 EUR)	
Reálny fakturovaný náklad	38 970 EUR s DPH	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	áno
	b/ v realizácii	
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	-
	d/ nezačaté	-

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Lenka Nemcová, referát riadenia projektov

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 2.7 – Projekty MČ Združené financovanie z podprogramov: 1) PERFECT (Interreg Europe) 2) MITADAPT (Program SK-Klíma, Nórske granty) 3) DELIVER (program LIFE, EÚ)	
Názov predmetu investície	Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve	
Opis predmetu investície	Pilotný projekt vodozádržných opatrení na verejnom priestranstve Kaskády. Náklady na projektovú dokumentáciu a samotnú realizáciu vodozádržných opatrení - terénne a sadové úpravy. Realizácia podľa PD Fáza 1 a 2: • inštalácia 2 podzemných PE plochých podzemných nádrží s objemom 7,5 m ³ , • 2 dažďové záhrady/mokradňové záhony, • 7 zatravnených retenčných plôch o celkovej výmere 34 m ² a 85 m ² • výsadba 21 kusov drevín a kríkov.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	40 000 EUR s DPH realizácia (+ 15 000 EUR - projektová dokumentácia)	
Vysúťažený náklad	35 185,23 EUR s DPH (+ 13 680,00 EUR - projektová dokumentácia)	
Reálny fakturovaný náklad	35 185,23 EUR s DPH (+ 13 680,00 EUR - projektová dokumentácia)	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	Áno (1. a 2.etapa)
	b/ v realizácii	-
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Podaná žiadosť o NFP do Operačného programu IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk, prioritná os: 7 – REACT-EU, Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, Budovanie zelenej infraštruktúry v mestách. Podaný projekt: NFP302070BXK5, Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve (3.etapa) Očakávaný termín vyhodnotenia: 30.06.2022
	d/ nezačaté	-

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Zásobník projektov

REFERÁT INVESTÍCIÍ

Investičná akcia	Podľa rozpočtu z PD (Eur s DPH)
ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia soc. zariadení (juh) - Vypracovaná PD pre realizáciu stavby - Vybavené ohlásenie stavebnému úradu - Pripravené na obstarávanie zhotoviteľa.	204.901 eur
Rekonštrukcie parkoviska pred cirk. školou sv. F. z Assisi na Karloveskej 32 <i>transfer Magistrát na základe memoranda z roku 2019</i> - Treba aktualizovať projektovú dokumentáciu pre územné konanie, doriešiť súlad s územným plánom, vypracovať dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu, vydanie stavebného povolenia	
Rekonštrukcia interiéru SŠ Tilgnerova - objekt Farduszova 10 – výdajňa stravy - Vypracovaná PD pre realizáciu stavby.	149.249 eur
Rekonštrukcia NP Segnerova 1/B - II.etapa - Vypracovaná PD pre realizáciu stavby.	104.976 eur
Rekonštrukcia KCK - Vypracovaná PD pre realizáciu stavby. - Vybavené ohlásenie stavebnému úradu na rekonštrukciu strechy - Vybavené ohlásenie stavebnému úradu na rekonštrukciu sociálnych zariadení	
	Strecha 77.000 eur
	exteriérové schodisko 19.000 eur
	fasáda/okná 110.000 eur
	interiér/STAV/EL/ZTI/VZT/PBS 385.000 eur
Sociálna výdajňa Lackova - Prípravné práce	
PumpPark Karlova Ves (dráha pre Pumptrack v areáli ZŠ Dubčeka, Majerníkova) - Prípravné práce	

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 6.2 Vybudovanie chodníka a cesty na Perneckej ulici z vlast. zdrojov	
Názov predmetu investície	Vybudovanie chodníka a cesty na Perneckej ulici z vlastných zdrojov	
Opis predmetu investície	Zámerom je rekonštrukcia cesty s novým asfaltovým povrchom pozdĺž novobudovaného chodníka na Perneckej ulici.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	117.416,30 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	106.177,18 eur s DPH	
Fakturovaný náklad	Zatiaľ nefakturované	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	áno
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Ukončenie stavebných prác
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Pôvodný stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 7.1 MŠ Kolískova, 3. etapa rekonštrukcie	
Názov predmetu investície	MŠ Kolískova, 3.etapa rekonštrukcie	
Opis predmetu investície	Zámerom je výmena podláh na chodbách a schodiskách, výmena podláh v triedach a spálňach, výmena podhládov a svietidiel za LED v triedach a spálňach, vymaľovanie priestorov MŠ, oprava vstupov do budovy MŠ, oprava terasy zo severnej strany.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	194.585,83 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	155.316,65 eur s DPH	
Fakturovaný náklad	Zatiaľ nefakturované	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	áno
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Ukončenie stavebných prác, odovzdanie do užívania
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 6 – Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba 6.2 Vybudovanie chodníka Sološnícka	
Názov predmetu investície	Spojovací chodník medzi ul. Kuklovská a Sološnícka v k.ú. Karlova Ves PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	
Opis predmetu investície	Zámerom je vybudovať nový spevnený chodník, ktorý bude prepojením ulíc Kuklovská a Sološnícka.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	10.000 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	12.000 eur s DPH (z toho za časť DUR 6.000 eur s DPH)	
Fakturovaný náklad	---	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	áno
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 6.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične	
Názov predmetu investície	Obnova časti objektu mimoškolskej starostlivosti (telocvične so zázemím) v ZŠ Karloveská 61 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	
Opis predmetu investície	V návrhu sa bude uvažovať s nevyhnutnými prácami na obvodovom plášti (izolácia proti zemnej vlhkosti, zateplenie fasády a strechy, výmena okien /kopilitovej steny/ v telocvični a vchodových dvier), odvodnenie pozdĺž západnej strany objektu s terénnymi úpravami, obnova elektroinštalácie, obnova hygienických miestností (WC Ž, WC M, sprchy), kabinetu TV, posilňovne, šatní a skladov športových potrieb.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	24.000,00 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	19.440,00 eur s DPH	
Fakturovaný náklad	---	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	áno
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 7 – Školstvo a vzdelávanie 7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne	
Názov predmetu investície	ZŠ Majerníkova 60 – rekonštrukcia kuchyne, IS, VZT	
Opis predmetu investície	V roku 2020 bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu kuchyne v ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 60 Bratislava-Karlova Ves. V projekte je riešená kompletná rekonštrukcia stavebnej časti, zdravotníckej, elektroinštalácie, vzduchotechniky, plynofikácie, vykurovania, kuchynskej technológie a vybavenia.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	1.858.161,00 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	---	
Fakturovaný náklad	---	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	nie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav podľa požiadaviek požiarnej ochrany. Vypracovanie projektovej dokumentácie trafostanice, VN prípojky, NN prípojky, odsúhlasenie s ZsDIS a Technickou inšpekciou. Zmluvné vzťahy s ZsDIS. Riešenie vysporiadania pozemku pod trafostanicou.
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Allan Bánik, referát investícií

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky Program 8 – Kultúra a médiá 8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice	
Názov predmetu investície	Rekonštrukcia karloveskej knižnice – 3.etapa REALIZÁCIA	
Opis predmetu investície	V návrhu sa uvažuje s výmenou zasklenej fasády s nevyhnutnými stavebnými prácami na obvodovom plášti, s realizáciou zateplenia a nových obkladov fasády. Ďalšie práce sa týkajú podhľadu v interiérovej časti.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	60.000,00 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	---	
Fakturovaný náklad	---	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	nie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu, výber zhotoviteľa
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Jana Španková, referát dopravy

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba 6.2 Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. - vl. zdroje	
Názov predmetu investície	Rekonštrukcia Púpavovej ulice – I.etapa REALIZÁCIA	
Opis predmetu investície	V návrhu sa uvažuje s výmenou obrubníkov, asfaltového povrchu chodníkov a komunikácie, najmä jej vyspádovanie, aby sa tam netvorila po daždi voda. Projekt rieši nové umiestnenie kontajnerov, aby nestáli na novej komunikácii, ale aby boli umiestnené do novo navrhnutých kontajnerových stojísk. Rekonštrukcia celej komunikácie je rozdelená na etapy, plánovaná investícia sa bude týkať realizácie I.etapy.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	240.000,00 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	---	
Fakturovaný náklad	---	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	nie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu, výber zhotoviteľa
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav



Informatívny materiál
o štádiu investičných zámerov, investícií a projektov a projektových dokumentácií

Stav k 31.05.2022

spracoval: Ing. Jana Španková, referát dopravy

Položka v rozpočte	Kapitálové výdavky PROGRAM 6 – Doprava, cest. hospodárstvo, výstavba 6.2 Vybudovanie chodníka na Vretenovej ul. - PD -vl. zdroje	
Názov predmetu investície	Vybudovanie chodníka na Vretenovej ul. – Projektová dokumentácia	
Opis predmetu investície	V roku 2021 bola spracovaná „Technická štúdia – rekonštrukcia Vretenovej ul., Bratislava, Karlova Ves“ v troch variantoch. Na základe prerokovania návrhov, komisia dopravy odporučila na ďalšie spracovanie variant B. Zároveň na komisii dopravy a ŽP prijaté uznesenie, aby sa pokračovalo v rokovaní s primátorom o možnosti majetkového vysporiadania časti pozemku potrebnej k realizácii projektu, ktorá je vo vlastníctve Magistrátu. V komunikácii sa pokračuje, súčasne sa pripravujú podklady k žiadosti o zverenie a VO na projektanta.	
Typ obstarávania	Verejné obstarávanie	
Odhadovaný náklad	35.000,00 eur s DPH	
Vysúťažený náklad	---	
Fakturovaný náklad	---	
Stav investície v rozdelení:	a/ ukončené	nie
	b/ v realizácii	nie
	c/ plánované úkony do najbližšieho miestneho zastupiteľstva	Projektová dokumentácia - výber projektanta
	d/ nezačaté	-

Poznámka:

Súčasný stav

